

## 橋梁式新設運搬路の撤去工事の状況（その3）

### 1 概要

橋梁式新設運搬路の撤去工事については、第39回、第40回、第44回豊島廃棄物等管理委員会及び第1回豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会にて審議・承認され、工事を進めており、第1回豊島事業関連施設の撤去等検討会（H29.7.30開催）及び第2回豊島事業関連施設の撤去等検討会（H30.1.14開催）において撤去工事の進捗状況を報告したところである。

今回は、現在の工事の状況について報告する。

### 2 これまでの手続き状況

これまでの橋梁式新設運搬路の撤去工事の手続きの状況は、表1のとおりである。

表1 工事の手続き状況

		橋梁式新設運搬路の撤去工事
工事の実施事業者		(株)坂本工業
工期		H29.4.3～H30.3.30
手続きの状況	発注仕様書の作成	H29.2～3
	入札公告	H29.3.15～H29.3.24
	実施事業者の決定	H29.4.3
備考		昨年度に発注手続き済みである。

### 3 現在の工事の実施状況及び今後の予定

#### (1) 橋梁式新設運搬路の撤去工事（資料1の別紙28-1）

廃棄物等の搬出が終了したことから橋梁式新設運搬路は平成29年7月より撤去を開始し、覆工板、主桁及び杭基礎等を撤去したところである。今後、橋台の撤去は、現在実施中の中間保管梱包施設の解体撤去後の平成30年3月中旬以降に実施することとしており、3月中に撤去が完了する予定である。

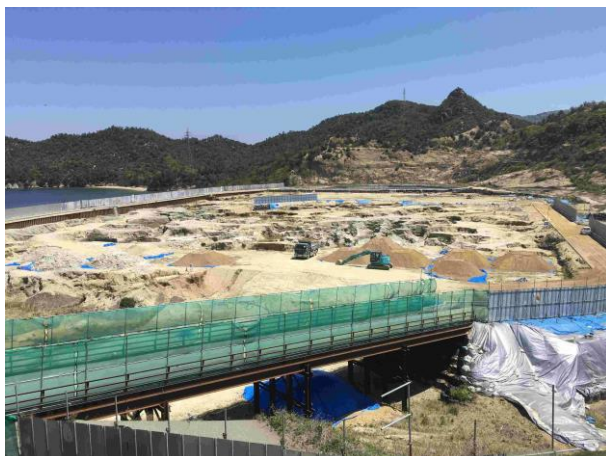


写真1 撤去前の状況  
(H29.4.24撮影)



写真2 杭基礎等撤去後の状況  
(H29.12.12撮影)

写真3 橋台の存置状況 (H30. 3. 2 撮影)

表2 橋梁式新設運搬路の撤去工事の実施スケジュール  
(H30. 3. 8 時点の実績 ←→ と予定 ←----→ )

内容	施工期間								
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
覆工板等の撤去	←→								
主桁等の撤去	←→								
杭基礎の撤去	←→	←→							
橋台の撤去									←→

## 処分地内の地下水等対策と安全対策に伴う応急的な整地の状況（その2）

### 1 概要

応急的な整地工事については、第1回豊島事業関連施設の撤去等検討会（H29.7.30開催）及び第1回地下水・雨水等対策検討会（H29.9.3開催）において了承を得て、工事を進めており、第2回豊島事業関連施設の撤去等検討会（H30.1.14開催）において撤去工事の進捗状況を報告したところである。現在の工事の状況について報告する。

### 2 これまでの手続き状況

これまでの応急的な整地工事の審議等の手続き状況は、表1のとおりである。

表1 各工事の手続き状況

		応急的な整地工事
工事の実施事業者		八坂建設(有)
工期		H29.9.27～H30.3.30
手続きの状況	発注仕様書の作成	H29.8～9
	発注仕様書の審議	第1回撤去等検討会で審議済み(H29.7.30) 第1回地下水・雨水等対策検討会で審議済み(H29.9.3)
	入札公告	H29.9.15～H29.9.26
	実施事業者の決定	H29.9.26
	実施計画書の審議	第2回地下水・雨水等対策検討会で審議済み(H29.11.26) 第2回撤去等検討会前の持ち回り(H29.12.27)

### 3 現在の工事の実施状況及び今後の予定

応急的な整地工事については、表2のとおり、平成29年11月に工事を開始し、整地を行いながら、コンクリートヤードと井戸側の一部の施工が完了したところで、引き続き井戸側の施工と整地を行い、平成30年3月頃に工事が完了する予定である。



写真1 施工状況（H30.2.16撮影）



写真2 井戸側の設置状況

表2 応急的な整地工事の実施スケジュール（H30.3.5時点の実績 ←→ と予定 ←--→）

内容	施工期間					
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
整地			←→	←→	←→	←--→
鬼真砂土の搬入	↔ ↔	↔				
井戸側の設置				←→	←→	←--→
コンクリートヤード			←→			



← : 表面水の流れ

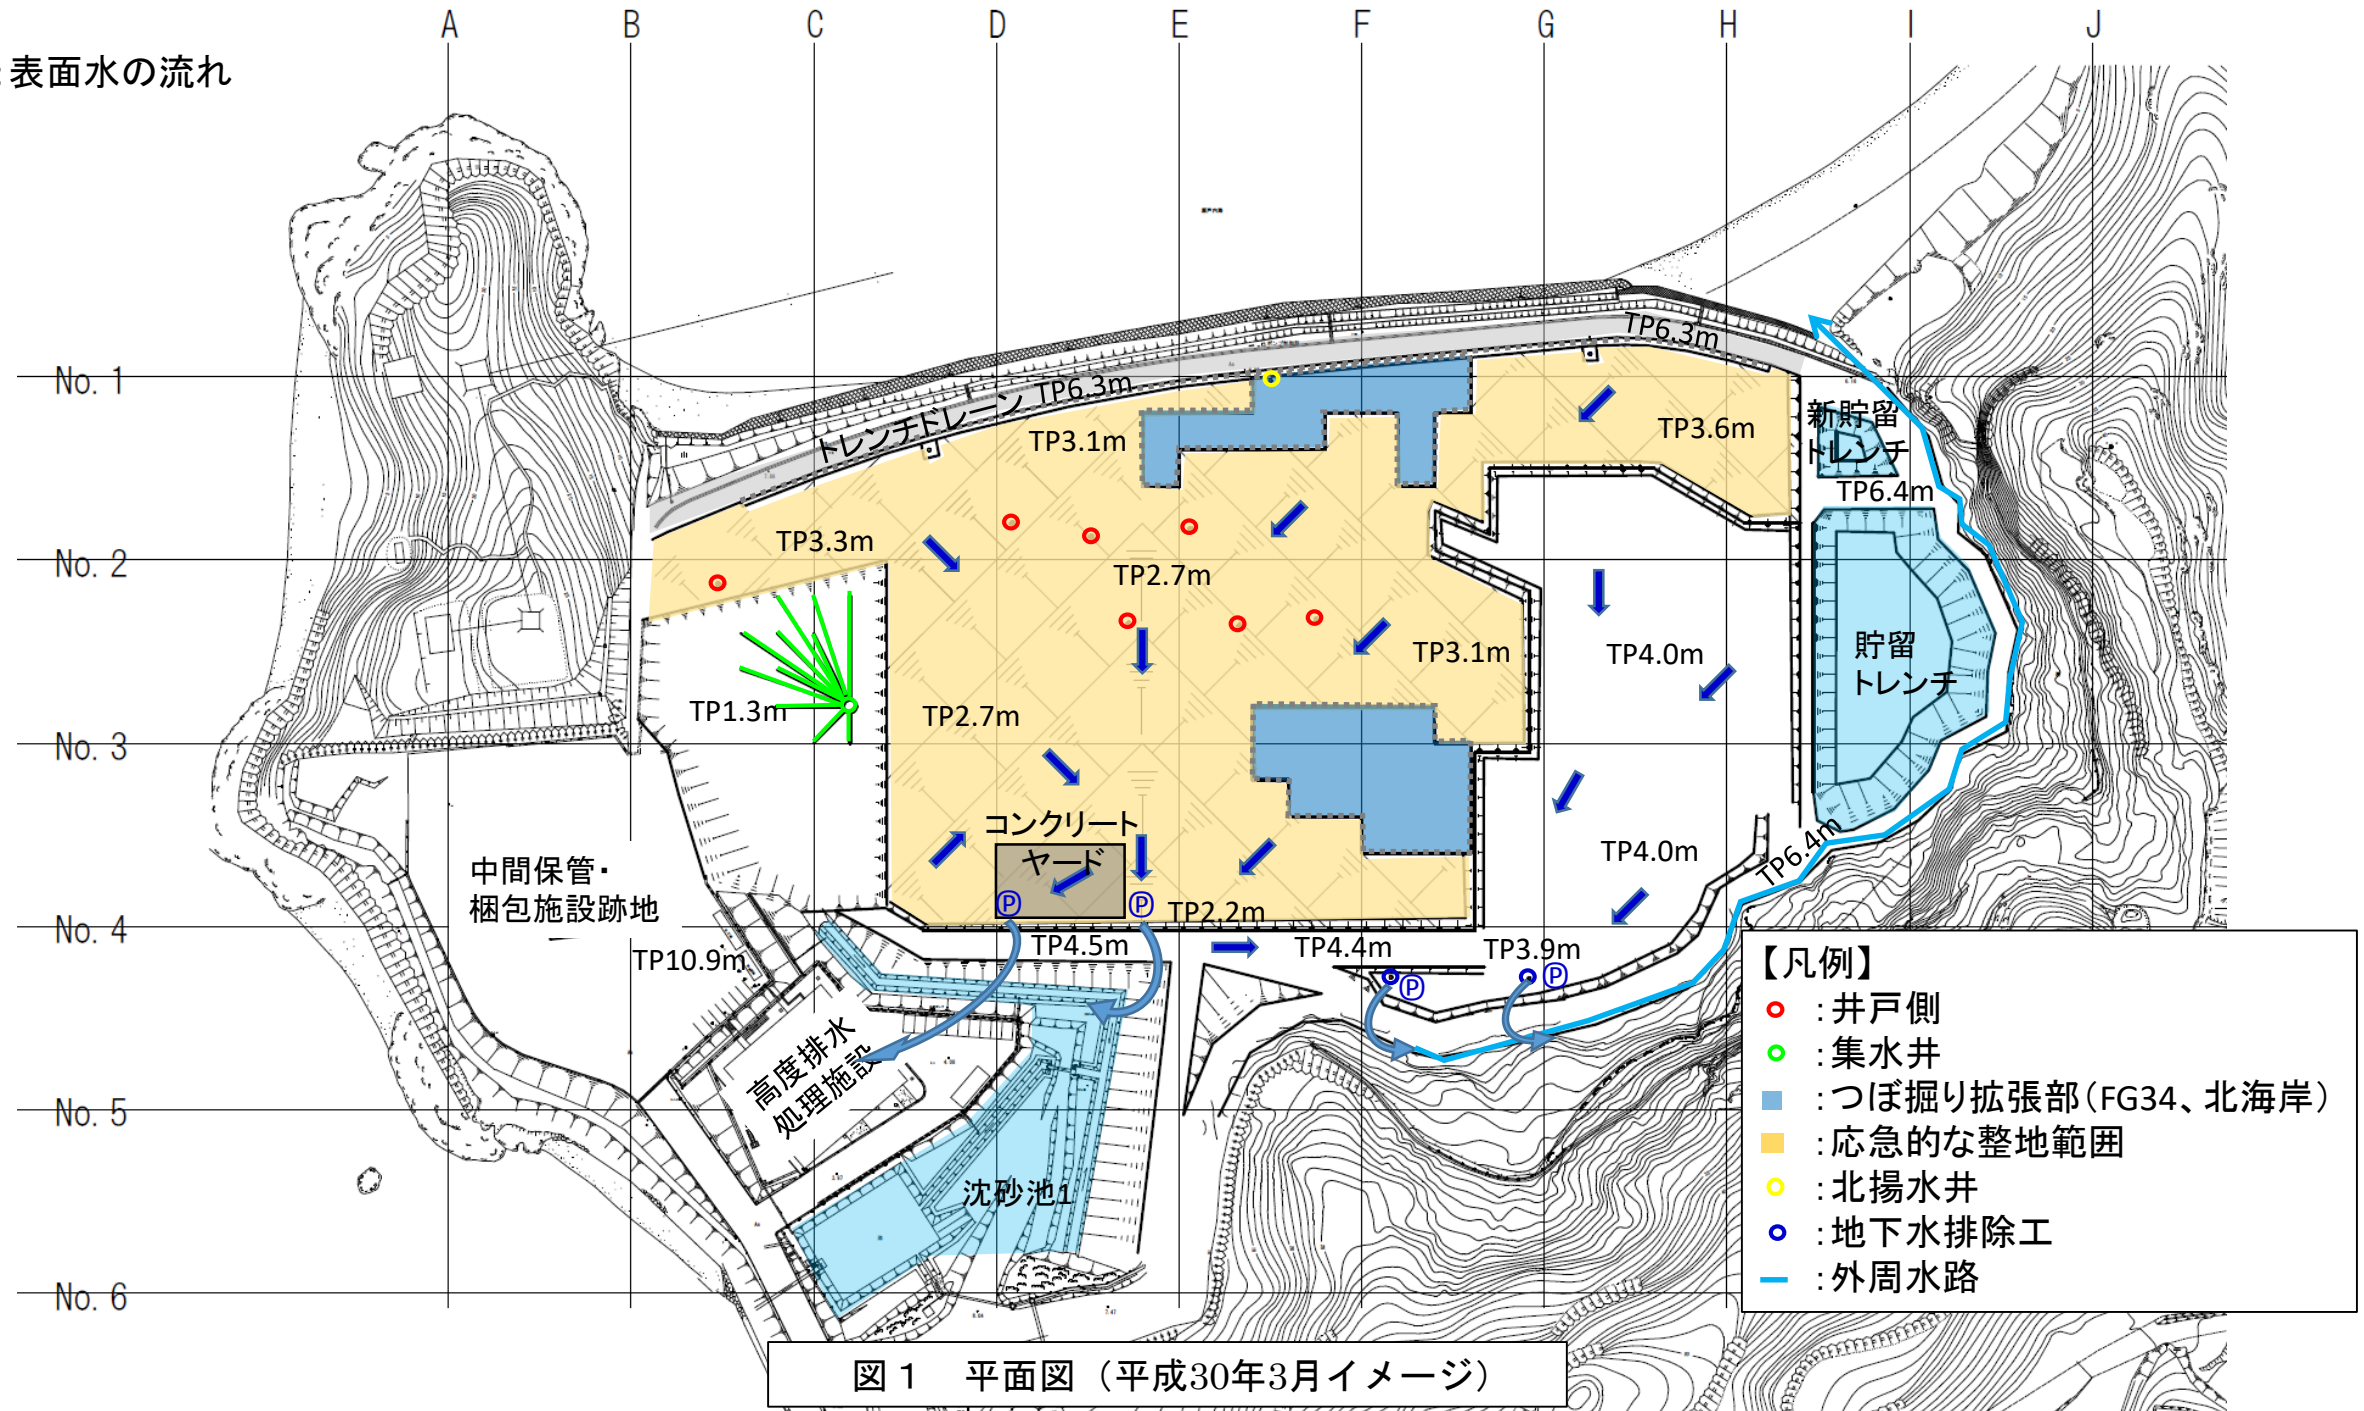


図1 平面図 (平成30年3月イメージ)

## 坂出スラグステーションの撤去工事の状況（その3）

### 1 概要

坂出スラグステーションの撤去工事については、第40回、第44回豊島廃棄物等管理委員会及び第1回豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会にて審議・承認され、工事を進めており、第1回豊島事業関連施設の撤去等検討会（H29.7.30開催）及び第2回豊島事業関連施設の撤去等検討会（H30.1.14開催）において撤去工事の進捗状況を報告したところである。今回は、現在の工事の状況について報告する。

### 2 これまでの手続き状況

坂出スラグステーションの撤去工事は、施工箇所が広範囲になることから3工区に分けて発注した。手続きの状況は、表1のとおりである。

表1 各工事の手続き状況

		第1工区	第2工区	第3工区
工事の実施事業者		五栄海陸興業(株)	(有)古竹建設	新川産業(株)
工期		H29.9.22～H30.3.31	H29.9.25～H30.2.28	H29.10.5～H30.3.30
手続きの状況	発注仕様書の作成	H29.8～9	H29.8～9	H29.8～9
	入札公告	H29.9.22（変更契約日）	H29.9.13～H29.9.22	H29.9.26～H29.10.4
	実施事業者の決定	H29.9.22※	H29.9.25	H29.10.5
	実施計画書の審議	第2回撤去等検討会前の持ち回り（H29.10.24）	第2回撤去等検討会前の持ち回り（H29.10.24）	第2回撤去等検討会前の持ち回り（H29.10.24）
備考		発注仕様書の審議は、一般土木工事仕様書により発注したため、省略した。		

※坂出スラグステーション管理業務の変更対応

### 3 現在の工事の実施状況

坂出スラグステーションの撤去工事については、表2のとおり、平成29年10月に工事を開始し、全ての工事が完了した。



写真1 撤去前の状況 (H29. 6. 20 撮影)



写真2 整地後の状況 (H30. 3. 12 撮影)

表2 撤去工事の実施スケジュール (H30. 3. 10 時点の実績 ←→ と予定 ←---→)

内容		施工期間						
		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
第1工区	構造物撤去		←→					
第2工区	管理用道路部分表土掘削		←→					
	構造物撤去			←→				
	仮囲い撤去				←→			
第3工区	準備工 (伐採等)		←→					
	構造物撤去			←→	←→	←→	←→	←→
	整地					←→	←→	←→

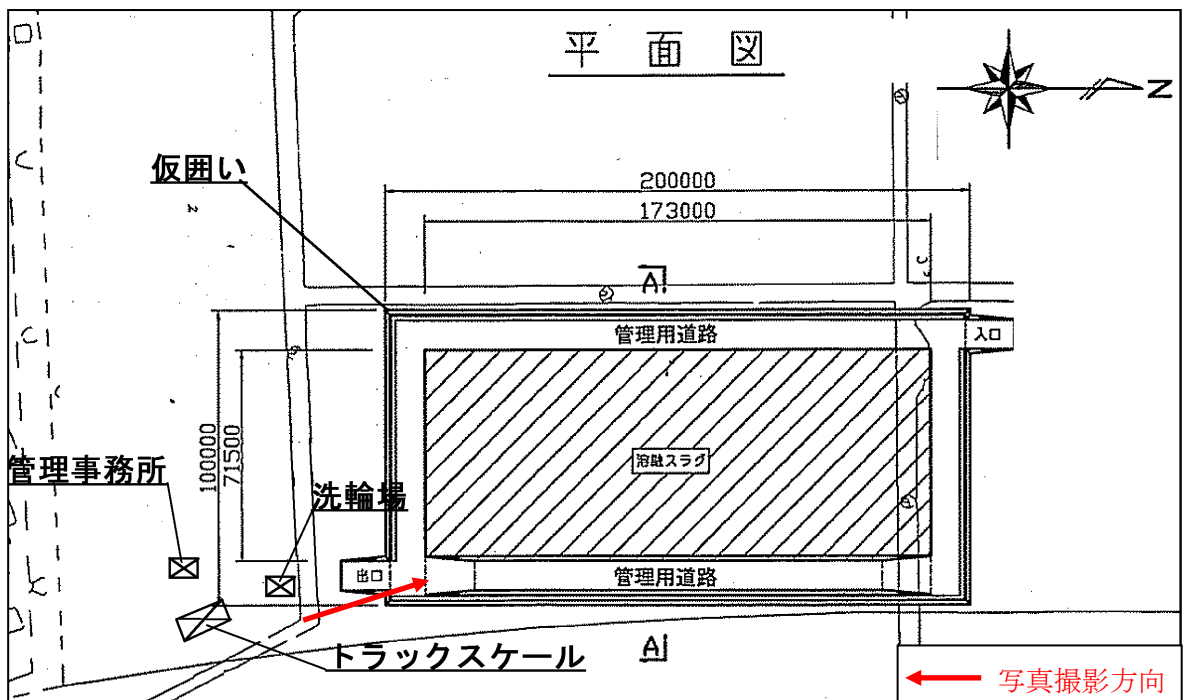


図1 平面図

## 豊島中間保管・梱包施設及び特殊前処理物処理施設の撤去等報告書の目次案

### 目次（案）

1. 豊島中間保管・梱包施設等の撤去等に関する基本方針等
2. 撤去等の対象施設の範囲及び概要
3. 撤去等の手続き方法
4. 撤去等の実施事業者
5. 撤去等の期間
6. 除去・除染の実施
  - (1) 実施体制等
  - (2) 環境保全対策
  - (3) 安全確保対策
  - (4) 除去・除染の作業内容
    - ①中間保管・梱包施設の設備等での作業
      - ・保管ピット
      - ・ごみクレーン
      - ・投入ホッパ
      - ・切出しコンベヤ
      - ・積込室
      - ・脱臭剤噴霧装置
      - ・投入前室
    - ②特殊前処理物処理施設の設備等での作業
      - ・切断機
      - ・ドラム缶反転装置
      - ・作業フード
      - ・特殊前処理室
    - ③その他の設備等での作業
      - ・環境集じん設備等
      - ・地下排水ピット等
    - ④建築構造物



- (5) 作業環境測定結果
- (6) 除染完了確認調査結果
- (7) 除染作業に伴う排水管理
- (8) 設備等からの作動油等の回収
- (9) アスベスト・リフラクトリーセラミックファイバー・フロン類への対応
- (10) 除染等廃棄物の集積
- (11) 環境負荷項目の計測及び集計

## 7. 解体撤去等の実施

- (1) 実施体制等
- (2) 環境保全対策
- (3) 安全確保対策
- (4) 解体撤去等の作業内容
  - ①内装解体
  - ②建物解体
  - ③基礎解体
- (5) 作業環境測定結果
- (6) 施設撤去廃棄物等の分別及び処理委託
- (7) 環境負荷項目の計測及び集計

## 8. 施設の撤去等に係る環境計測結果

## 9. 委員又は技術アドバイザーによる撤去完了の確認

## 10. 情報の収集、整理及び公開

### (参考資料)

- 別紙1 豊島中間保管・梱包施設等の撤去等に関する基本方針
- 別紙2 豊島中間保管・梱包施設等の撤去等に関する基本計画
- 別紙3 ガイドライン
- 別紙4 マニュアル
- 別紙5 除去除染の作業写真
- 別紙6 解体撤去等の作業写真
