


## ②一般国道438号 飯山バイパス はんざん



- ① H23年 4月 4車線供用
- ② H24年 3月 2車線供用  
→R元年 9月 4車線供用
- ③ H25年 7月 2車線供用
- ④ H25年 10月 4車線供用
- ⑤ H27年 2月 2車線供用  
→R元年 9月 4車線供用
- ⑥ H27年 3月 2車線供用
- ⑦ H29年 4月 2車線供用
- ⑧ R3年 8月 1車線供用  
(近隣の生活車両のみ)

凡 例	
<span style="color: red;">——</span>	供用区間
<span style="color: red;">- - - - -</span>	未供用区間

この地図は、測量法第29条に基づく承認「平28情視、第634号」を得て、国土地理院発行の5万分の1地形図を複製したものを、一部転載したものである。

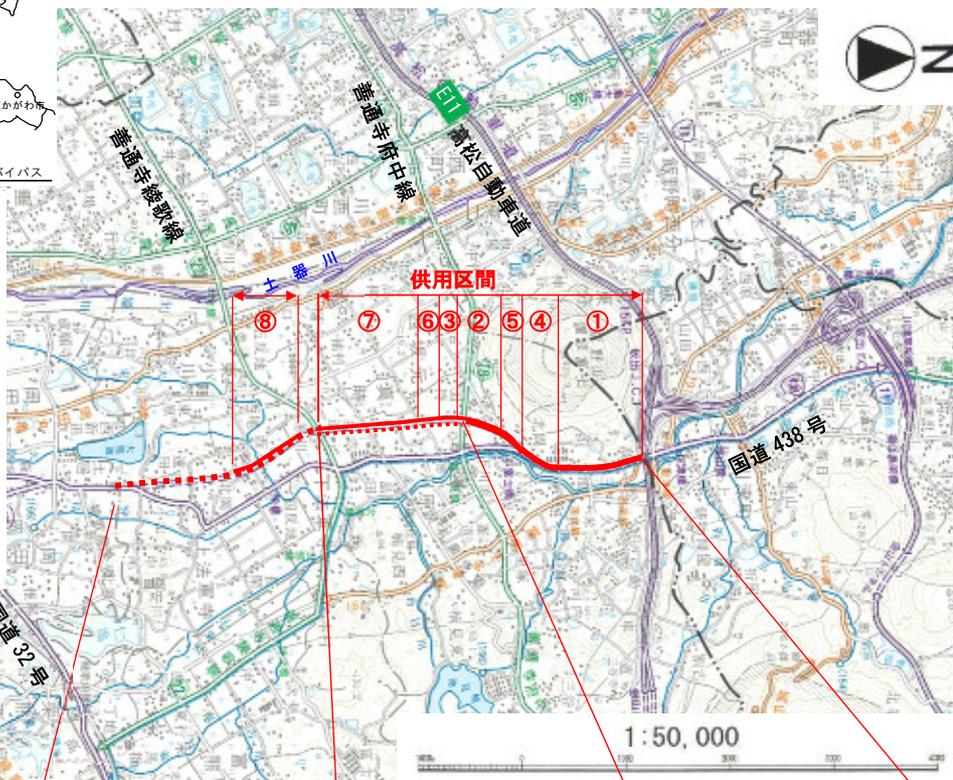

令和5年5月現在

区 間	丸亀市飯山町上法軍寺 ～県道善通寺綾歌線	県道善通寺綾歌線～ 県道善通寺府中線	県道善通寺府中線～ 坂出市川津町
延 長	2.0km	1.3km	1.8km
所 在 地	坂出市・丸亀市飯山町		
供用開始年度	令和3年8月 一部供用開始 (近隣の生活車両のみ) 令和9年度供用開始予定 (全線4車線)	平成29年度供用開始 (暫定2車線) 令和9年度供用開始予定 (全線4車線)	平成26年度供用開始 (現道拡幅部: 4車線) バイパス部: 暫定2車線 令和元年9月供用開始 (全線4車線)
測量着手年度 [着手率(延長比)]	平成23年度 [100%]	平成15年度 [100%]	平成9年度 [100%]
設計協議着手年度 [着手率(延長比)]	平成24年度 [100%]	平成19年度 [100%]	平成9年度 [100%]
用地買収着手年度 [進捗率(面積比)]	平成26年度 [99%]	平成21年度 [100%]	平成10年度 [100%]
工事着手年度	平成29年度	平成22年度	平成13年度
令和5 年度 事業 内容	測量・設計	埋蔵文化財発掘調査	—
	用 地	用地買収 物件補償	—
	工 事	改良工事	—


# 一般国道438号 飯山バイパス 整備状況 (1 / 2)

写真位置図



この地図は、測量法第29条に基づく承認「平28情復、第634号」を得て、国土地理院発行の5万分の1地形図を複製したものを、一部転載したものである。

写真①

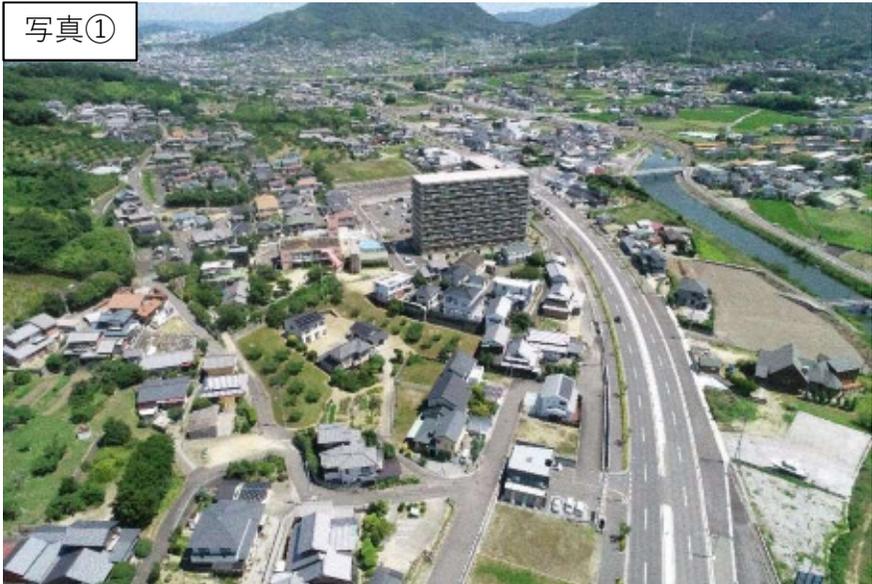

写真②



写真③



# 一般国道438号 飯山バイパス 整備状況 (2 / 2)

写真位置図



写真④



写真⑤



写真⑥

