

資料 9

■事後評価（社会資本総合整備計画）

室本港における安全で利便性の高い港湾環境の整備（防災・安全）

観音寺市

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金） 事後評価書

計画の名称	室本港における安全で利便性の高い港湾環境の整備（防災・安全）		
計画の期間	平成29年度～令和3年度（5年間）	交付対象	香川県観音寺市
計画の目標			

海岸保全施設の長寿命化計画の策定、背後地の人口が集中する地域の浸水の恐れがある面積の低減を実現し、安全安心な地域づくりを実現する。

1. 事業効果の発現：十分な効果があった

- ・全延長の長寿命化計画の策定を完了
- ・90mの護岸を補修

計画の成果目標（定量的指標）	津波・洪水等による浸水被害を軽減させる。		
----------------	----------------------	--	--

定量的指標の定義及び算定式		定量的指標の現況値及び目標値			達成率	備考					
		当初現況値	中間目標値	最終目標値							
津波・洪水等による浸水被害の軽減面積		(H29当初) 0ha	(R元末) 4ha	(R3末) 8ha	100.0%	津波・洪水等による浸水被害の軽減面積					
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	160百万円	A	160百万円	B	-	C	-	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	進捗率 (事業費ベース)	100.0%
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	160百万円	A	160百万円	B	-	C	-	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)		

A1 海岸事業												全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）								
										H29	H30	R元	R2	R3				
A1-1	海岸	一般	香川県	直接	観音寺市	老朽化	室本港海岸長寿命化計画策定策定業務	護岸363m	観音寺市						3	3	100%	完了
A1-2	海岸	一般	香川県	直接	観音寺市	老朽化	室本港海岸老朽化対策緊急事業	護岸90m	観音寺市						157	157	100%	完了
小計（海岸事業）												160	160	100%				

C 効果促進事業												全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
C1 河川効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					
										H28	H29	H30	H31	H32	
小計															

番号	一体的に実施することにより期待される効果														

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業												全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）						
									H28	H29	H30	H31	H32		
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果														

要素事業の事業進捗
計画通り進捗

2. 今後の方針

完了

- ・令和3年度をもって交付金事業での老朽化対策は完了した。

事後評価書参考資料

■事後評価（社会資本総合整備計画）

室本港における安全で利便性の高い港湾環境の整備（防災・安全）


観音寺市



出典：観音寺市全図より抜粋

対策内容

- ・長寿命計画策定 L=363m
- ・老朽化対策工事 L= 90m

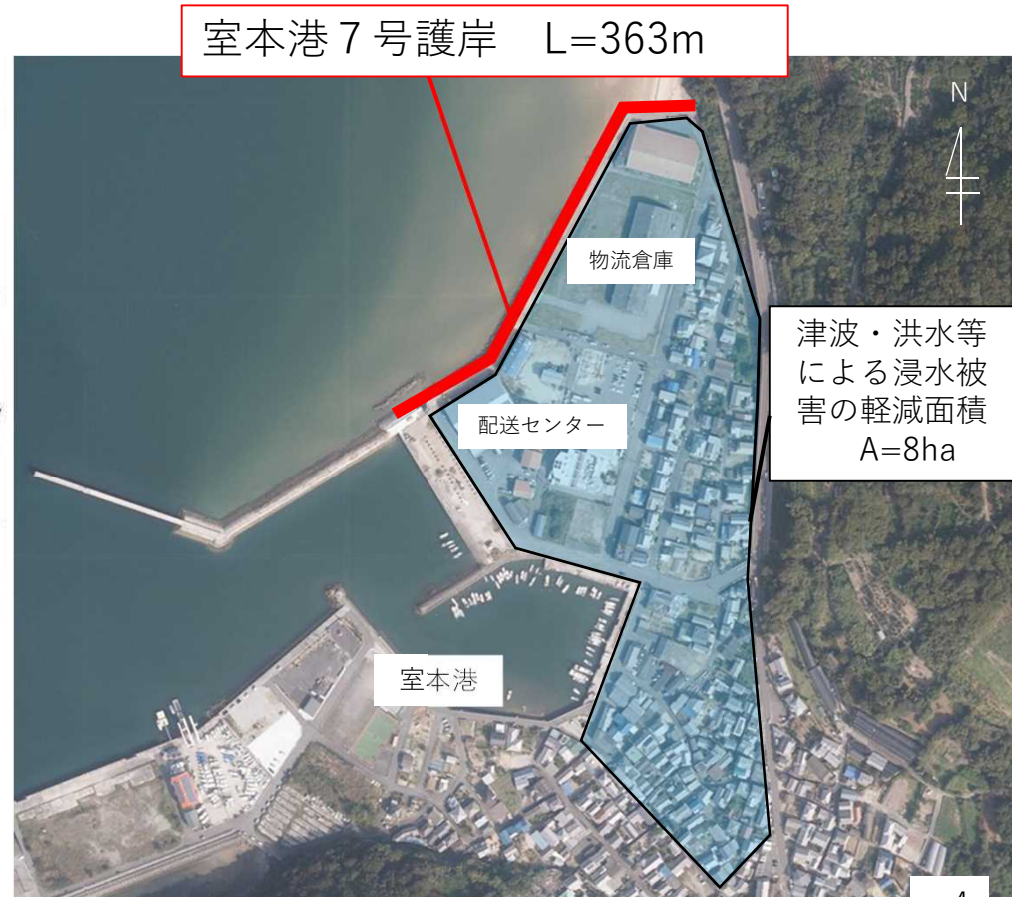


事業概要

港名	施設種別	事業名	全延長	完了延長
室本港	外郭施設	室本港海岸長寿命化計画 策定業務	363m	363m
		室本港海岸老朽化対策緊急事業	90m	90m

事業概要




整備前



整備後

事業概要

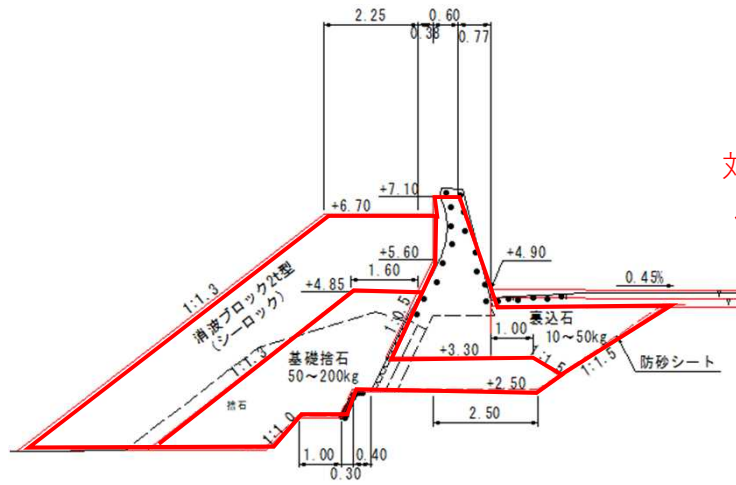

室本港海岸老朽化
対策緊急事業 L=90m

室本港海岸長寿命化計画策定業務
L=363m

